

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DPS	<b>Ing. Igor Hrazdil</b> projekty, inženýrská činnost, provádění staveb <b>Křely 81, 363 01 OSTROV</b> tel.: +420 776 555 866, IDDS: se4jac2 e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043	
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	05/2020		
		POČET STRAN	5		
STAVEBNÍK : Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov				ČÍS.ZAKÁZKY	OZN.PŘÍL.
STAVBA : <b>Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace</b>				<b>20-020</b>	<b>E1</b>
OBSAH : <b>ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY</b>				ČÍSLO KOPIE	

### a) Popis staveniště:

Stavba je zčásti situována na stávající místní komunikaci – chodníku v ulici Spojovací, většinou však na pozemku sousedícím s ulicí Větrná vedeného jako trvalý travní porost.

Staveniště je umístěno na pozemcích v majetku stavebníka – města Horní Slavkov. Pozemky dotčené stavbou jsou specifikovány v příloze F1 – Doklady.

Umístění staveniště viz grafické přílohy. Zařízení staveniště (ZS) je možné na p.p.č. 2252/78 v ulici Nová. Oplocení staveniště nebude provedeno, obvod staveniště však být musí výrazně označen.

Umísťování deponií či mezideponií stavebních hmot na staveništi není možné. Veškeré materiály musí být přiváženy a odváženy v množství zpracovatelném a zabudovatelném na místě stavby.

Příjezd a přístup na staveniště je z místních komunikací – ulice Větrná, Nová a Spojovací.

### b) Významné sítě technické infrastruktury:

Stavba se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí stanovených dle [4], [5] a [6] (na obě strany vždy od vnějšího líce potrubí, zařízení nebo od krajního vodiče):

- kabely VO a NN do 110 kV OP = 1,0 m
- kabely sdělovací – telefonní OP = 1,0 m

Stavba nezasahuje do ochranných pásem, avšak tato se nacházejí v blízkosti stavby:

- vodovodní a kanalizační řady do průměru 500 mm včetně OP = 1,5 m
- NTL plynovod v zastavěném území obce OP = 1 m

**Inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně, před započítáním prací je nutné je vytýčit!**

**Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky ochrany správců sítí uvedené v jejich vyjádřeních (viz dokladová část PD).**

### c) Napojení staveniště:

Stavba nemá nároky na napojení na vodovodní řad. Zásobování vodou se předpokládá mobilními zásobníky. Sociální zařízení bude řešeno mobilním WC. Jeho umístění je možné na p.p.č. 2252/78.

Stavební stroje nejsou závislé na elektrické energii. Drobné stroje a elektrické nářadí budou připojeny na mobilní zdroje elektrické energie (elektrocentrály).

Odvodnění staveniště bude provedeno do vsaku.

Telefonní spojení bude zajišťováno mobilními operátory.

**d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob:**

Obvod staveniště je nutno zajistit podle požadavků BOZP. Je nutno zajistit zvláště výkopy hlubší než 50 cm proti pádu osob. Jako vhodné řešení se jeví provizorní oplocení nebo ohrazení výkopů. Oplocení nebo ohrazení musí splňovat požadavky na bezpečnost osob se sníženou schopností orientace – zarážku pro slepeckou hůl ve výši 100 – 250 mm nad pochůznou plochou.

Na perimetru staveniště – na straně místní komunikace musí být zřetelně vyznačen zákaz vstupu nepovoláných osob.

**e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů:**

Provádění stavby musí splňovat veškeré právní a technické předpisy platné v době realizace.

Dále musí být nakládáno s odpady dle platných předpisů, dodržovány požadavky na ochranu životního prostředí před znečištěním a poškozením a před nadměrnými emisemi hluku.

**f) Řešení zařízení staveniště:**

Zařízení staveniště se předpokládá na p.p.č. 2252/78 v ulici Nová. WC bude mobilní (např. TOI).

**g) Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení:**

Zařízení staveniště je součástí stavby a nevyžaduje ohlášení.

**h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti:**

V oblasti BOZP budou při realizaci stavby dodržovány veškeré právní a technické předpisy platné v době realizace stavby, zejména nařízení Vyhl. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Českého úřadu bezpečnosti práce v platném znění, Vyhl. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, Vyhl. 73/1994 Sb. o zajištění bezpečnosti práce a provozu skladovacích zařízení sypkých hmot ČBÚ, Vyhl. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnost provozu při svislé dopravě a chůzi ČBÚ a Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci..., Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích atd..

**i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě:****i.1 Nakládání s odpady:**

Základní právní rámec pro chování a jednání osob účastnících se přípravy a realizace stavby je dán Zák. č. 17/1992 Sb., zákonem o životním prostředí, ve znění Zák. č. 123/1998 Sb. V oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady bude při přípravě a realizaci stavby postupováno dle Zák. 106/2005 Sb. resp. Zák. 185/2001 Sb., zákona o odpadech, především ve smyslu znění Vyhl. 93/2016 Sb., Vyhl. 383/2001 Sb., Vyhl. 130/2019 atd. vše v aktuálním znění.

170101	Beton	(silniční a záhonové obruby, dlažby)
170302	Asfaltové směsi	(vybourané živичné kryty a podkl. vrstvy)
170504	Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503	

Množství odpadů skupiny 17 dle Přílohy č. 1 k Vyhl. č. 381/2001 Sb. viz výkaz výměr.

Odpady budou přednostně využívány způsoby R5 (betonové sutě) dle Přílohy č. 3 Zák. 185/2001 Sb. a R13. Nadbytečná zemina z odkopávek a vykopávek bude odvezena na skládku pro využití k technické rekultivaci. Dočasné deponie odpadů se nenacházejí na pozemku stavby.

## **i.2 Emise hluku:**

Z hlediska emisí hluku budou stroje, mechanismy a zařízení splňovat požadavky plynoucí z Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ve smyslu znění Nařízení vlády č. 342/2003 Sb. Dále budou vyloučeny práce v nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků.

## **i.3 Ochrana ŽP před znečištěním a poškozením:**

Provádění stavby nesmí kontaminovat prostředí ropnými látkami. Na staveništi (v prostoru zařízení staveniště) musí být zajištěny potřebné prostředky pro likvidaci ropných havárií (Vapex apod.) a dále dostatečné množství prostředků pro likvidaci případných požárů (přenosné hasicí přístroje).

Při provádění prací se nepředpokládá znečišťování prostředí nadměrnou prašností. V případě, že by přesto mělo k tomuto dojít, je zhotovitel povinen provádět skrápění pracoviště vodní mlhou pomocí mobilního zařízení (cisterna). Pro ochranu životního prostředí před výfukovými zplodinami je zhotovitel povinen dbát na to, aby technický stav strojů a mechanismů vyhovoval platným předpisům a aby v době nečinnosti neběžely motory naprázdno.

Musí být zajištěna ochrana stromů před poškozením vlivem provádění stavebních prací. Veškeré stromy na staveništi, v prostoru zařízení staveniště nebo v blízkém okolí stavby musí být ochráněny proti mechanickému poškození. Výkopové práce v blízkosti stromů provádět v souladu s ČSN 83 9061/2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Technický dozor investora bude při své činnosti dohlížet mj. na výše plnění uvedených podmínek a dbát na jejich dodržování.

## **j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů:**


Předpokládaná lhůta výstavby je dle zkušeností z podobných staveb do 1 měsíce. Vzhledem k neznámému termínu realizace není stanoven harmonogram prací.

## **k) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy:**


Při výstavbě bude v průběhu provádění prací v ulici Větrná a Spojovací její částečná uzavírka. Uzavírky budou realizovány jako standardní pracovní místo podle schéma B/2 TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 12/2003.

Povolení uzavírky si zhotovitel zajistí v rámci dodávky stavebních prací. Po celou dobu prací musí zůstat veškeré místní komunikace průjezdné. Návrh uzavírek je uveden na obr. č. 1. až 3.

Obr. č. 1 – částečná uzavírka Větrné ulice 1:750:

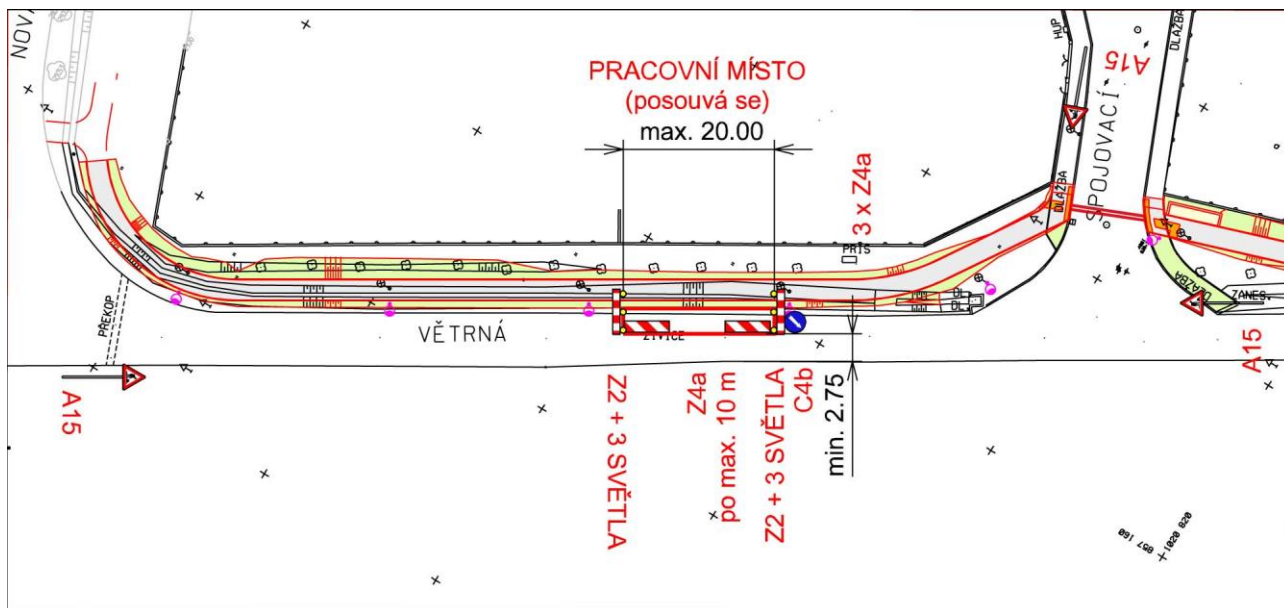

Obr. č. 2 – částečná uzavírka ulice Sportovní 1:750:

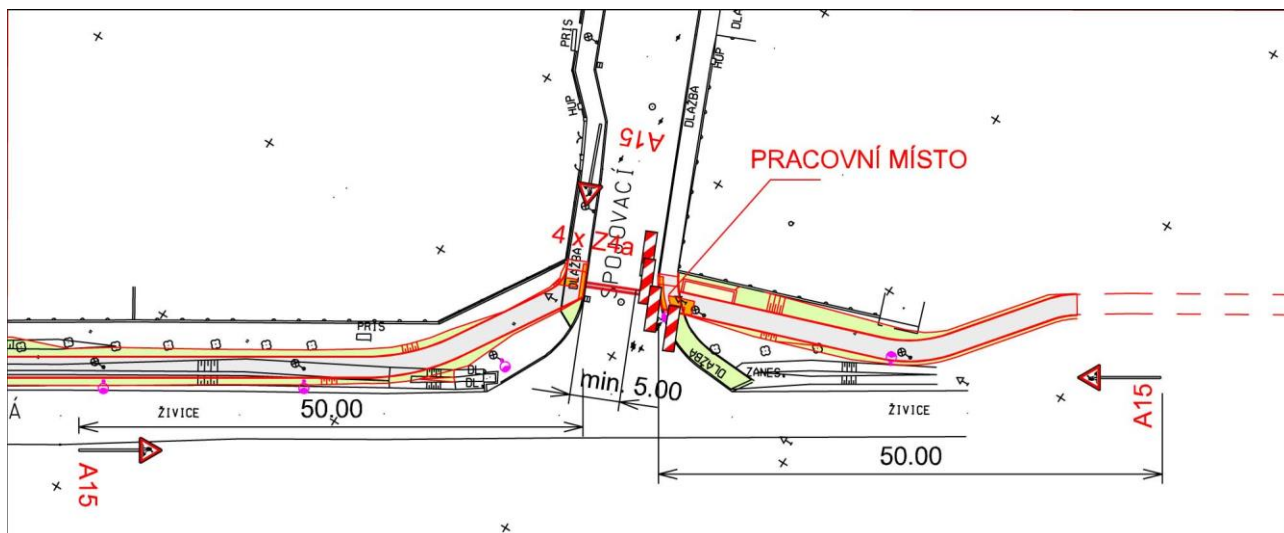

Obr. č. 3 – částečná uzavírka ulice Sportovní 1:750:

